

RAPPORT N° 00/8-10
au Conseil Municipal

OBJET

PARC URBAIN (tranche paysagère Sud-Est)
CRAC 1999

Par Délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 1997, la Commune a confié à la SODIAC un Mandat pour la réalisation d'une première tranche paysagère au Sud-Est du Parc Urbain, sur la base d'une enveloppe financière prévisionnelle fixée à 20 072 186,85 F TTC.


Cette opération a déjà fait l'objet des études globales d'Avant-Projet, des études de Projet des terrassements généraux. Une première phase de travaux a été réceptionnée fin 1999 alors que la seconde est actuellement en cours de réalisation.

Le Compte Rendu Annuel à la Concédant établi au 31 décembre 1999 fait apparaître un montant de dépenses prévisionnel de 20 072 090,61 F TTC.

Je vous demande d'approuver le CRAC 1999 de l'opération ayant valeur de bilan actualisé, arrêté à 20 072 090,61 F TTC et présenté par la SODIAC.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

LE MAIRE
Michel TAMAYA



REÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION

29 DEC. 2000

ARTICLE 2 DE LA LOI N° 82-213 DU 2 MARS 1982
RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTÉS DES
COMMUNES, DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS

COMMUNE DE SAINT-DENIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DELIBERATION N° 00/8-10
du Conseil Municipal
en séance du jeudi 14 décembre 2000

OBJET

PARC URBAIN (tranche paysagère Sud-Est)
CRAC 1999

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée ;

Vu le Code des Communes ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le Rapport N° 00/8-10 du Maire ;

Vu le Rapport de Monsieur Alain ARMAND, 1^{er} Adjoint, 1^{er} Adjoint, présenté au nom des Commissions Aménagement et Entreprise Municipale / Finances ;


Sur l'avis favorable desdites Commissions ;

APRES EN AVOIR DELIBERE
A LA MAJORITE
(6 votes contre - dont 1 par procuration)

Approuve le CRAC de l'opération Parc Urbain (tranche paysagère Sud-Est) établi au 31 décembre 1999 et présenté par le Mandataire SODIAC.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Saint-Denis, le **21 DEC 2000**


LE MAIRE
Michel TAMAYA



Ma Ville construit **Parc Urbain de la Trinité**

Ma Ville construit

- 1 Aire de jeux
- 2 Passage inférieur
- 3 Terrasse sur la mer
- 4 Butte belvédère
- 5 Jardin d'herbacées
- 6 Jardin de galets
- 7 La plaine des jeux
- 8 Parking
- 9 Clairière pique-nique
- 10 Plantes hygrophiles

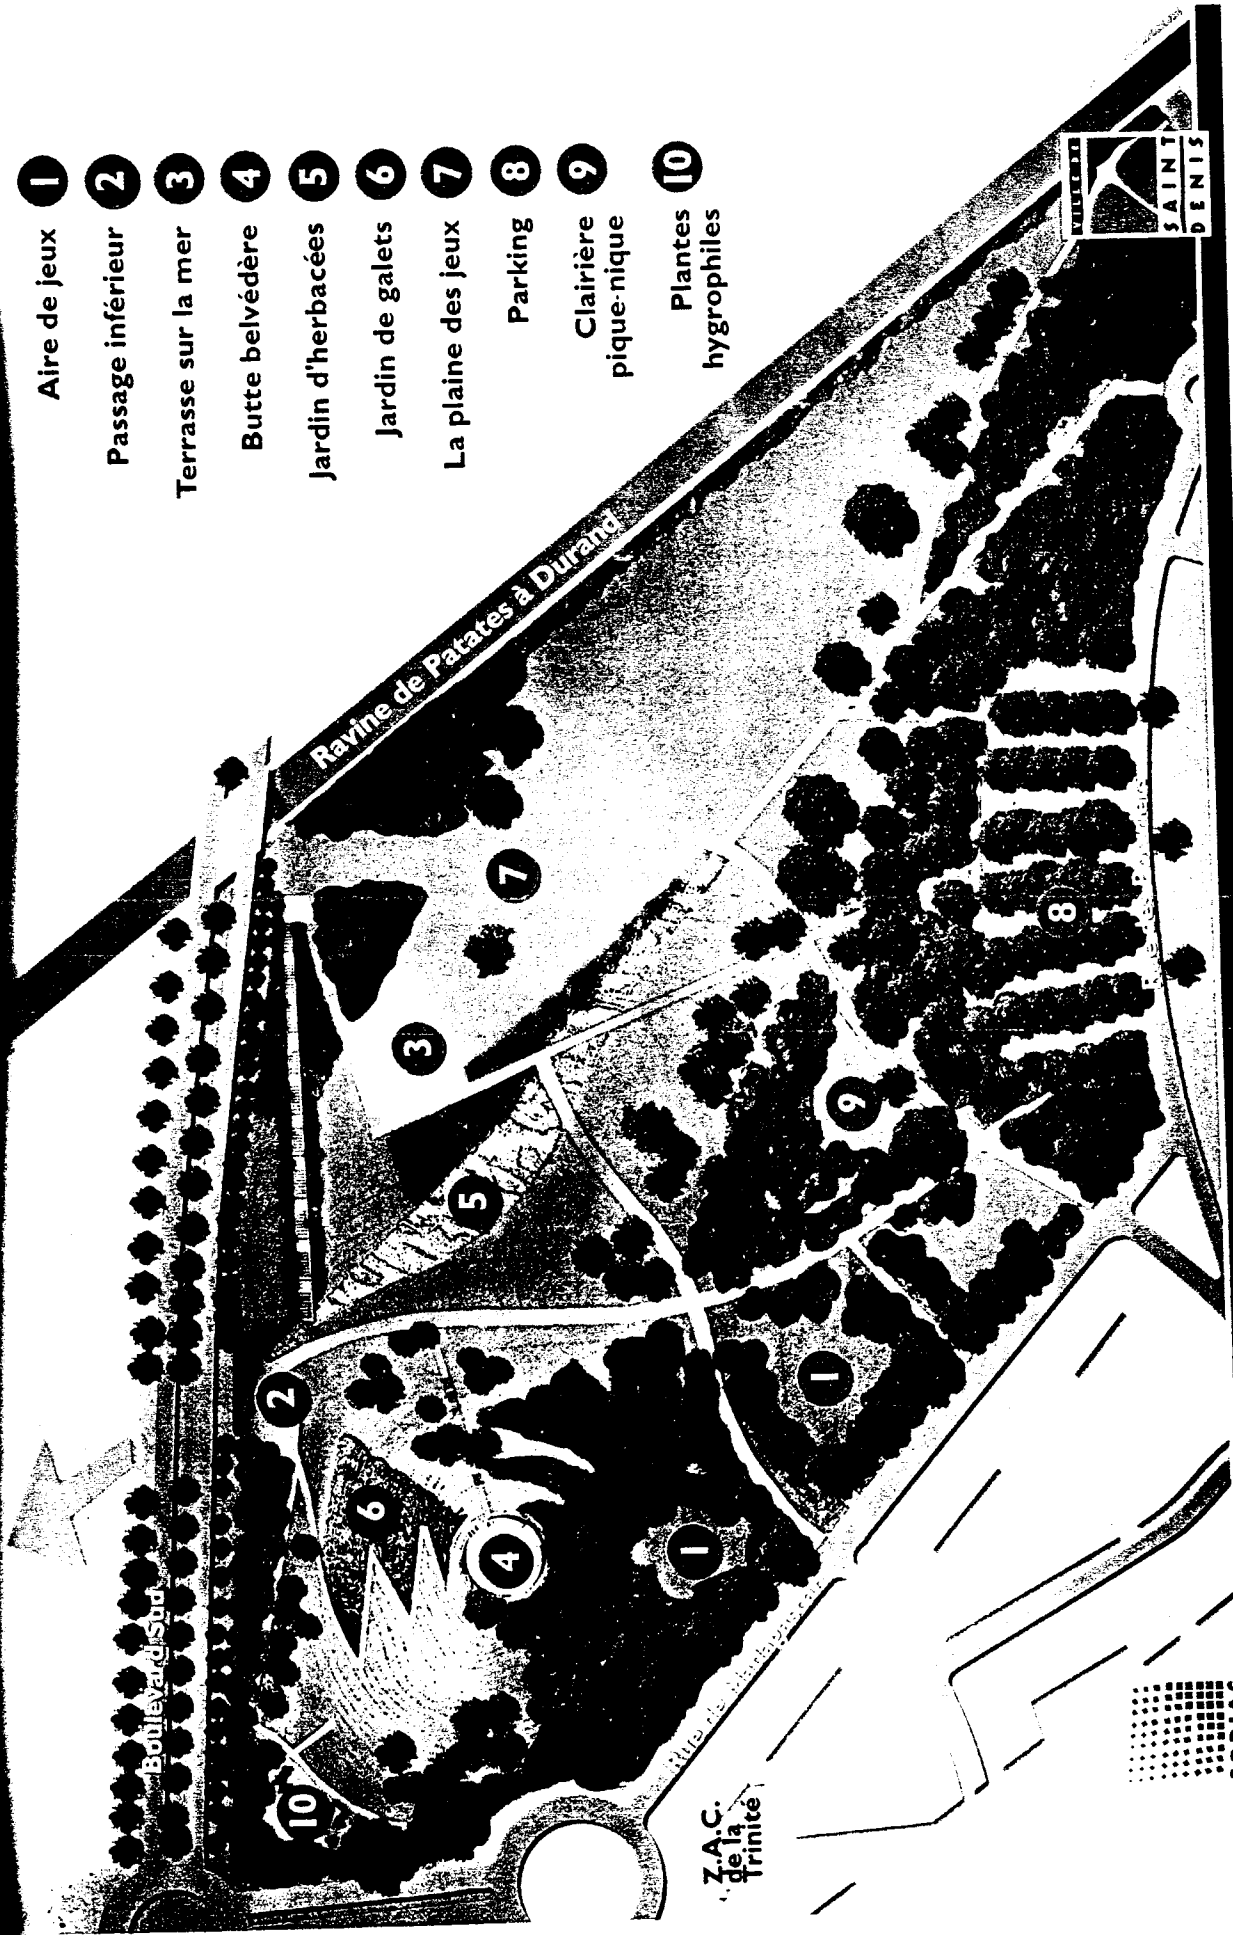


SODIAC

VILLE DE
SAINT
DENIS

S A I N T
D E N I S

Vu par le Conseil Municipal de Saint-Denis
en séance du jeudi 14 décembre 2000
et annexé à la Délibération n° 00/8-10

LE MAIRE
Michel TAMAYA




COMPTE-RENDU

D'ACTIVITE

A LA COLLECTIVITE

EXERCICE 1999



SOCIETE DIONYSIENNE
D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION

50 Quai Ouest
BP 710
97473 SAINT-DENIS CEDEX

SOMMAIRE

| | |
|--|-----------|
| 1 – PRESENTATION DE L'OPERATION | 3 |
| 1.1 – PRÉAMBULE | 3 |
| 1.2 – LES OBJECTIFS | 3 |
| 1.3 – PROGRAMME GÉNÉRAL DU PARC URBAIN | 4 |
| 1.4 – PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA TRANCHE PAYSAGÈRE SUD-EST | 4 |
| 1.5 – PLAN D'ENSEMBLE | 5 |
| 2 – DONNEES ADMINISTRATIVES ET CONTRACTUELLES | 7 |
| 2.1 – RAPPEL DES DONNÉES ADMINISTRATIVES DU MANDAT | 7 |
| 2.2 – RAPPEL DES DONNÉES CONTRACTUELLES | 7 |
| 3 – ETAT DES REALISATIONS AU 31/12/99..... | 9 |
| 3.1 – LES ETUDES | 9 |
| 3.2 – LES TRAVAUX | 9 |
| 4 – PERSPECTIVES | 9 |
| 5 – BILAN..... | 10 |
| 5.1 – DEPENSES (EXPRIMEES EN F TTC) | 10 |
| 5.2 – RECETTES (EXPRIMEES EN F TTC) | 10 |
| 5.3 – COMMENTAIRES SUR LE BILAN ACTUALISÉ..... | 11 |
| 6 – TRESORERIE | 11 |
| 7 – ANNEXE | 11 |

CRAC 1999

**PARC URBAIN DE LA TRINITE
TRANCHE PAYSAGERE SUD-EST**

Le présent Compte Rendu d'Activité à la Collectivité concerne la réalisation d'une première tranche ferme du Parc Urbain de la Trinité correspondant à la zone sud-est et délimitée par :

- le boulevard Sud au nord,
- la rue de Madagascar à l'ouest,
- la rue des Poiriers au sud,
- le canal des Patates à Durand à l'est.

Il est établi conformément aux lois du 7 juillet 1983 et 8 février 1995 et en application de la convention de mandat.

Ce rapport vise à présenter à la Ville de Saint-Denis Mandant, une description de l'avancement de l'opération en termes physique et financier, notamment afin de lui donner les moyens de suivre le déroulement de l'opération et lui permettre de décider, le cas échéant, des mesures à prendre pour maîtriser l'évolution de l'opération.

1 – PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1 – Préambule

De longue date, la collectivité a envisagé la réalisation d'un parc urbain de plusieurs dizaines d'hectares sur le site formant anciennement le cône de déjection des ravines Patates à Durand et Butor.

L'emprise foncière concernée par ce projet est grossièrement constituée de deux triangles dont les bases sont pour l'un, le canal des Patates à Durand à l'est et pour l'autre, le chemin des Poivriers au Sud, les « pointes » correspondant à la ravine du Butor au droit des carrefours boulevard Vauban / boulevard Sud et la rue Delattre de Tassigny au nord.

Consciente de l'intérêt d'un tel projet pour la structuration de l'agglomération et pour le bien être futur des populations urbaines, la collectivité a pris des dispositions réglementaires afin de préserver ces espaces ouverts d'un seul tenant.

Après s'être assurée de l'opportunité et de la faisabilité de l'ouvrage, la collectivité a décidé de procéder à l'aménagement des dix hectares formant la zone sud-est de ce parc.

Les emprises foncières nécessaires à la réalisation des aménagements projetés sont propriété communale.

1.2 – Les objectifs

❖ L'objectif principal :

✓ Il s'agit d'abord d'un parc intégré à la ville. Il doit être un lieu pour tous permettant la promenade, mais aussi les activités sportives et ludiques. Il est essentiellement végétal pour offrir un confort aux dionysiens et compenser la dévégétalisation des zones urbaines construites.

✓ C'est un équipement à l'échelle de la ville et de l'île, qui doit faciliter les liaisons entre les quartiers riverains actuellement séparés les uns des autres par le poêle d'enseignement du Butor et l'ancien cône de déjection des ravines.

❖ Les objectifs secondaires :

✓ Il doit être conçu comme un espace de sécurité, aussi bien par sa forme que de par son fonctionnement.

✓ Il peut être le siège d'équipements pour la ville ou pour le quartier.

✓ L'utilisation des images habituelles de paysages et des essences d'arbres locaux doit être recherchée.

1.3 – Programme général du Parc Urbain

Il s'organise sur 60 ha en 4 parties :

- la partie paysagère (25 ha) qui non seulement doit proposer des espaces de qualité mais doit aussi donner le « ton » et déterminer l'aspect des autres parties suivantes.
- l'espace de la forme (19 ha) qui intègre les équipements sportifs existants et propose un complément d'utilisation,
- le complexe immobilier (10 ha) s'organise autour d'une place « de ville », et doit recevoir aussi bien des équipements nécessaires à la cité, que des équipements de quartier. Il doit permettre de résoudre une partie de la crise du logement, toutes catégories confondues, tout en réorganisant le front urbain des bas des Camélias et de Montgaillard, à l'aspect actuel très désordonné. Il doit aussi dégager des recettes destinées à soulager le bilan financier de l'opération.
- les voiries, dont le boulevard Sud (6 ha) qui structurent l'organisation générale, coordonnent différentes parties et rendent lisible l'aménagement.

1.4 - Programme détaillé de la tranche paysagère sud-est

En vue de définir le parti d'aménagement de cette tranche paysagère d'une contenance de 10 ha, d'en arrêter le programme détaillé et également de disposer d'une base estimative des travaux, la Collectivité a eu recours à la procédure d'études de définition permettant de mettre en concurrence plusieurs concepteurs.

Les grands éléments constitutifs du programme proposé par le projet lauréat à l'issue de cette procédure s'appuient sur la volonté de connecter les allées du parc avec les espaces urbains du quartier et de les composer selon les axes Est-Ouest et Nord-Sud.

Viennent s'inscrire dans ce maillage fonctionnel :


- ✓ **une aire de jeux** qui vient en appui sur le canal des Patates à Durand, constituant un vaste espace de liberté à destinations multiples.
- ✓ **une futaie**, avec clairières, en interface entre le Parc et le complexe immobilier, pour donner ombre et fraîcheur et également créer une transition avec les bâtiments proches,
- ✓ **une vallée**, dont le mouvement assure la coordination du réseau des chemins et allées du Parc et, qui assure la connexion du Parc au nord avec l'espace du vélodrome et les équipements sportifs, via le passage inférieur sous le boulevard Sud.
- ✓ **Un belvédère**, la colline de l'harmonie, qui offre de magnifiques panoramas sur l'horizon de l'océan et la découverte du centre ville sur l'arrière plan de la falaise.
- ✓ **Différentes compositions végétales et minérales** : jardin d'eau, d'herbacées et de galets sur le flanc et en pied de la butte belvédère,
- ✓ **Une zone de parkings** en contact avec la futaie.

1.5 - Plan d'ensemble

Ma Ville construit Parc Urbain de la Trinité

Ma Ville construit

- 1 Aire de jeux
- 2 Passage inférieur
- 3 Terrasse sur la mer
- 4 Butte belvédère
- 5 Jardin d'herbacées
- 6 Jardin de galets
- 7 La plaine des jeux
- 8 Parking
- 9 Clairière pique-nique
- 10 Plantes hygrophiles

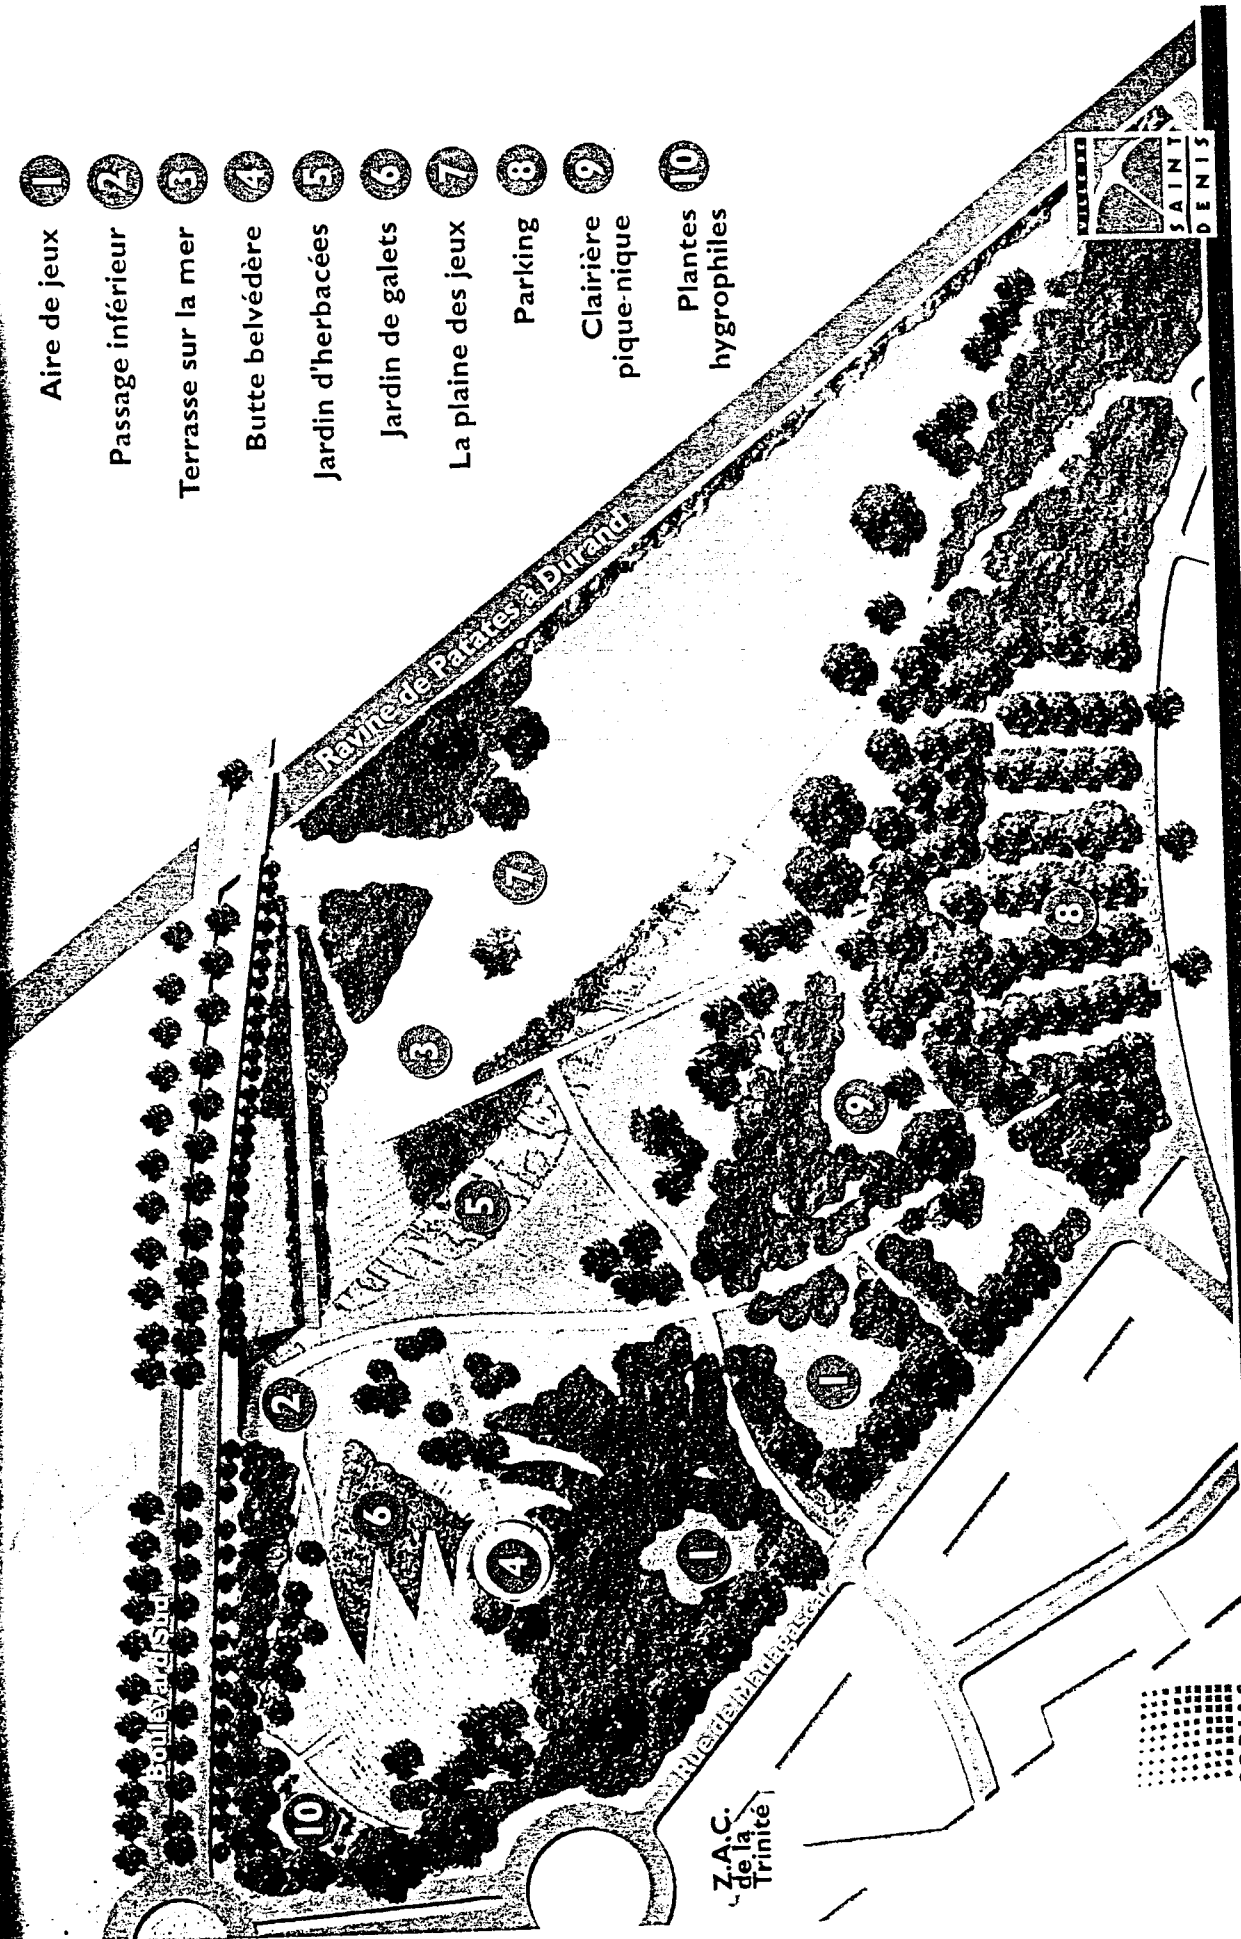

VILLE SAINT DENIS

SODIAC

Z.A.C. de la Trinité

2 - DONNEES ADMINISTRATIVES ET CONTRACTUELLES

2.1- Rappel des données administratives du Mandat

- ❖ Autorisation de confier une convention de réalisation à la SODIAC, avec transfert des contrats pour permettre leur poursuite par le Mandataire

Conseil municipal du 19/12/97

Délibération n° 97.3-25

Reçue en préfecture le 18/05/98

Date de notification le 19/05/98

La réception des travaux est prévue au 4^{ème} trimestre 2000

La convention de Mandat expire au terme de la garantie de parfait achèvement, de la liquidation des marchés et de la reddition définitive des comptes.

- ❖ Approbation du programme de l'opération

Conseil municipal du 19/12/97

Délibération n° 97.3-24

- ❖ Approbation de l'avenant de prorogation de la durée de la convention de mandat

Conseil municipal du 20/10/2000

Délibération n° 00.6-46

Reçue en préfecture le 30/10/00

Date de notification le 06/11/00

2.2 - Rappel des données contractuelles

- ❖ Autorisation de signer le contrat de maîtrise d'œuvre à la suite d'une procédure d'études de définition

Conseil municipal du 27/01/98

Délibération n° 98.1-11

Reçue en préfecture le 11/03/98

- ❖ Approbation du programme de terrassements généraux (1^{ère} phase)

- ◆ Autorisation donnée au mandataire de lancer la procédure d'appel d'offres et de signer les marchés de travaux correspondants

Conseil municipal du 30/10/98

Délibération n° 98.6-46

Reçue en préfecture le 10/11/98

- ❖ Approbation du programme de terrassements généraux (2^{ème} phase)
 - ◆ Autorisation donnée au mandataire de lancer la procédure d'appel d'offres et de signer les marchés de travaux correspondants
 - Conseil municipal du 30/06/99
 - Délibération n° 99/4-39
 - Reçue en préfecture le 07/07/99

- ❖ Autorisation donnée au mandataire de signer l'avenant n°1 au marché de travaux de terrassements généraux (1^{ère} phase)
 - Conseil municipal du 30/06/99
 - Délibération n° 99/4-39
 - Reçue en préfecture le 07/07/99

- ❖ Autorisation donnée au mandataire de signer l'avenant n°2 au marché de travaux de terrassements généraux (1^{ère} phase)
 - Conseil municipal du 17/09/99
 - Délibération n° 99/4-07
 - Reçue en préfecture le 27/07/99

- ❖ Autorisation donnée au mandataire de signer l'avenant n°2 au marché de travaux de terrassements généraux (1^{ère} phase) après annulation de la délibération n°99/4-07
 - Conseil municipal du 14/12/99
 - Délibération n° 99/7-13
 - Reçue en préfecture le 23/12/99

- ❖ Approbation du programme de mise en place de terre végétale amendée, engazonnement et arrosage
 - ◆ Autorisation donnée au mandataire de lancer la procédure d'appel d'offres et de signer les marchés de travaux correspondants
 - Conseil municipal du 23/06/00
 - Délibération n° 00/4-12
 - Reçue en préfecture le 05/07/00

- ❖ Autorisation donnée au mandataire de signer l'avenant n°2 au marché de maîtrise d'œuvre
 - Conseil municipal du 20/10/00
 - Délibération n° 00/6-47
 - Reçue en préfecture le 06/11/00

3 – ETAT DES REALISATIONS AU 31/12/99

3.1 – Les études

La Ville de Saint-Denis a tout d'abord lancé une procédure d'études de définition destinée à mettre en concurrence plusieurs concepteurs courant 1997.

Le lauréat de cette consultation s'est vu confier une mission de maîtrise d'œuvre à l'issue de sa désignation, décomposée en une tranche ferme et une tranche conditionnelle.

Les études de la tranche ferme ont été engagées au cours du 3^{ème} trimestre 1998.

Un premier projet relatif à la 1^{ère} phase des terrassements généraux (moitié est : terrasse et plaine de jeux) a été validé fin 1998.

La deuxième phase de terrassements généraux (moitié ouest : butte belvédère, futaie, parkings) a fait l'objet d'un dossier élaboré courant 1999.

3.2 – Les travaux

Le marché de travaux de la 1^{ère} phase de terrassements généraux a été confié à l'entreprise MATIERE S.A. à l'issue d'une procédure de consultation organisée au cours du 1^{er} trimestre 1999.

En cours d'exécution, au terme des sondages prévus dans le cadre de ces travaux, il est apparu préférable d'anticiper la réalisation de certains terrassements pour permettre une bonne exécution des ouvrages et éviter le risque de déstabilisation des terres.

Quelques prestations du marché ont par ailleurs fait l'objet d'adaptations compte tenu de l'évolution du projet liée aux études de la deuxième phase d'aménagement.

Les ouvrages ont été réceptionnés à la date du 30/09/99.

4 – PERSPECTIVES

L'année 2000 sera consacrée à la poursuite des études de projet du programme de travaux de la tranche ferme ainsi qu'à l'engagement de la deuxième phase de terrassements généraux qui permettra d'achever le modelage du Parc et d'en dessiner les grands axes.

5 – BILAN

Le bilan au 31 décembre 1999 est établi sur la base de l'avancement physique décrit ci-avant et tient compte des dépenses et recettes comptabilisées à cette date.

5.1 – Dépenses (exprimées en F TTC)

| Rubriques | Bilan du Mandat | Réalisé au 31/12/99 | Bilan actualisé révisé au 31/12/99 | Reste à réaliser |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
| Etudes | | | | |
| Etude de sol | 197 100,00 | 68 328,00 | 197 100,00 | 128 772,00 |
| MOE conception | 1 203 405,00 | 569 664,54 | 1 203 405,00 | 633 740,46 |
| CSPS conception | 98 550,00 | 0,00 | 98 550,00 | 98 550,00 |
| Frais divers | 22 995,00 | 24 450,65 | 100 000,00 | 75 549,35 |
| Réalisation | | | | |
| MOE exécution | 881 475,00 | 126 836,26 | 881 475,00 | 754 638,74 |
| CSPS exécution | 164 250,00 | 0,00 | 164 250,00 | 164 250,00 |
| Frais divers | 54 750,00 | 36 175,36 | 98 000,00 | 61 824,64 |
| Travaux | 16 425 000,00 | 2 857 364,25 | 16 300 000,00 | 13 442 135,75 |
| Rémunération Mandataire | | | | |
| Phase conception | 328 500,00 | 164 250,00 | 328 500,00 | 164 250,00 |
| Phase réalisation | 575 711,85 | 119 456,79 | 575 711,85 | 465 255,06 |
| Clôture | 54 750,00 | | 54 750,00 | 54 750,00 |
| Acquisitions foncières | 65 700,00 | | 65 700,00 | 65 700,00 |
| Frais financiers | 0,00 | 4 648,76 | 4 648,76 | 0,00 |
| TOTAUX | 20 072 186,85 | 3 962 674,61 | 20 072 090,61 | 16 109 416,00 |

5.2 – Recettes (exprimées en F TTC)

Au 31/12/99 le bilan détaillé des recettes du Mandat s'établit comme suit :

| Rubrique | Bilan du mandat | Réalisé au 31/12/99 | Bilan actualisé au 31/12/99 | Reste à réaliser |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Avance de démarrage | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Remboursement des dépenses par la Ville de Saint-Denis | 18 072 186,85 | 3 459 485,41 | 18 072 090,61 | 14 612 605,20 |
| TOTAL TTC | 20 072 186,85 | 5 459 485,41 | 20 072 090,61 | 14 612 605,20 |

5.3 – Commentaires sur le bilan actualisé

L'actualisation du bilan de l'opération au 31/12/99 s'inscrit dans le respect de l'objectif financier fixé par la convention de mandat.

Les postes de frais divers sont revalorisés pour tenir compte du fractionnement des dossiers d'appel d'offres par éléments de programme et des frais corrélatifs.

6 – TRESORERIE

Au 31/12/99 l'opération fait apparaître une trésorerie positive résultant du solde de l'avance de démarrage, résorbée à l'avancement du remboursement des dépenses réalisées par la Mandataire.

7 – ANNEXE

Etat comptable récapitulatif des dépenses et des recettes.

Opération 116 PARC URBAIN DE LA TRINITE SE
DEPENSES CUMULEES REALISEES AU 31/12/99

Heure : 10:31
 Date : 22/11/00

| Date Ar | Mois R | Iméro Chro | N° autc | Nom Fournisseurs | Libellé | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|--|--------|------------|---------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 03/12/98 | 10/98 | | 100245 | CORAL DUD MICHEL | AC 01 | 63 219,20 F | 6 290,82 F | 72 510,02 F |
| 04/03/99 | 07/99 | 14522 | 103649 | CORAL DUD MICHEL | AC 02 | 169 349,66 F | 18 710,22 F | 218 059,88 F |
| 31/12/99 | 12/99 | 16004 | 105143 | CORAL DUD MICHEL | AC 05 | 81 677,47 F | 7 769,36 F | 99 446,83 F |
| MARCHE N° 98041 L.01 | | | | | | 344 846,33 F | 32 760,40 F | 377 606,73 F |
| 17/11/98 | 10/98 | | 98991 | REP AGENCE DES ES PAC | AC 01 | 99 636,95 F | 9 465,51 F | 109 102,46 F |
| 20/03/99 | 07/99 | 14736 | 103760 | REP AGENCE DES ES PAC | AC 02 | 75 758,31 F | 7 197,04 F | 82 955,35 F |
| MARCHE N° 98041 L.02 | | | | | | 175 395,26 F | 16 662,55 F | 192 057,81 F |
| LB 5100 ETUDE PREOPERATIONNELLE | | | | | | 520 241,59 F | 49 422,95 F | 589 664,54 F |
| 12/08/98 | 08/98 | 11563 | 99440 | JOC MECHY | | 62 400,00 F | 5 925,00 F | 68 325,00 F |
| 17/09/98 | 09/98 | 11655 | 99721 | JIR | | 1 651,68 F | 158,91 F | 1 810,59 F |
| 12/10/98 | 10/98 | 12001 | 99933 | JIR | | 1 669,44 F | 158,60 F | 1 828,04 F |
| 23/10/98 | 10/98 | 12085 | 99967 | JOURNAL OFFICIEL | | 1 652,00 F | 0,00 F | 1 652,00 F |
| 11/02/99 | 02/99 | 12921 | 101060 | JOURNAL OFFICIEL | | 1 008,00 F | 0,00 F | 1 008,00 F |
| 26/04/99 | 04/99 | 13569 | 101657 | JOURNAL OFFICIEL | | 282,00 F | 0,00 F | 282,00 F |
| 25/01/99 | 01/99 | 12766 | 100369 | LE JIF | | 1 209,50 F | 114,90 F | 1 324,40 F |
| 25/01/99 | 01/99 | 12772 | 100903 | LE JIF | | 348,50 F | 32,11 F | 380,61 F |
| 17/03/99 | 03/99 | 13220 | 101284 | LE JIF | | 389,50 F | 37,00 F | 426,50 F |
| 13/10/98 | 10/98 | 12010 | 99938 | LE QUOTIDIEN | | 1 297,66 F | 114,72 F | 1 412,38 F |
| 02/11/98 | 11/98 | 12170 | 100100 | LE QUOTIDIEN | | 1 266,74 F | 122,90 F | 1 389,64 F |
| 12/02/99 | 02/99 | 12935 | 101065 | LE QUOTIDIEN | | 1 107,00 F | 105,16 F | 1 212,16 F |
| 15/02/99 | 02/99 | 12958 | 101072 | LE QUOTIDIEN | | 533,00 F | 50,63 F | 583,63 F |
| 02/04/99 | 04/99 | 13373 | 101512 | LE QUOTIDIEN | | 512,50 F | 48,66 F | 561,16 F |
| 04/01/99 | 12/98 | 12600 | 100269 | PROJECT | | 275,00 F | 26,13 F | 301,13 F |
| 11/12/98 | 12/98 | 12461 | 100543 | PROJECT | | 434,12 F | 41,24 F | 475,36 F |
| 11/12/98 | 12/98 | 12460 | 100542 | PROJECT | | 795,00 F | 75,63 F | 870,63 F |
| 15/12/98 | 12/98 | 12472 | 100563 | PROJECT | | 3 012,88 F | 286,22 F | 3 299,10 F |
| 04/01/99 | 12/98 | 12608 | 100257 | PROJECT | | 886,42 F | 84,40 F | 970,82 F |
| 14/01/99 | 01/99 | 12701 | 100709 | PROJECT | | 560,16 F | 55,12 F | 615,28 F |
| 23/02/99 | 02/99 | 13017 | 101106 | PROJECT | | 320,32 F | 30,43 F | 350,75 F |
| 29/03/99 | 03/99 | 13329 | 101422 | PROJECT | | 3 158,64 F | 300,07 F | 3 458,71 F |
| 25/04/99 | 04/99 | 13559 | 101852 | PROJECT | | 247,32 F | 23,50 F | 270,82 F |
| MARCHE N° | | | | | | 84 985,40 F | 7 793,25 F | 92 778,65 F |
| LB 5140 FRAIS DIVERS PREOPERATIONNELS | | | | | | 84 985,40 F | 7 793,25 F | 92 778,65 F |
| PRD 1 ETUDE PREOPERATIONNELLE | | | | | | 605 226,99 F | 57 216,20 F | 662 443,19 F |
| 17/05/99 | 04/99 | | 102572 | MATIERE TRAVAUX PUBLIC | AC 01 | 22 489,71 F | 2 136,52 F | 24 626,23 F |
| 17/05/99 | 04/99 | 13773 | 102571 | MATIERE TRAVAUX PUBLIC | AC 01 | 427 364,64 F | 40 593,93 F | 467 958,57 F |
| 16/06/99 | 05/99 | 14092 | 103416 | MATIERE TRAVAUX PUBLIC | AC 02 | 37 537,45 F | 3 571,76 F | 41 109,21 F |
| 16/06/99 | 05/99 | 14092 | 103414 | MATIERE TRAVAUX PUBLIC | AC 2 | 714 351,43 F | 67 863,39 F | 782 214,82 F |
| 21/03/99 | 02/99 | 15060 | 104072 | MATIERE TRAVAUX PUBLIC | AC 03 - 06-07-08-9 | 60 947,09 F | 5 789,97 F | 66 737,06 F |
| 21/03/99 | 02/99 | 15060 | 104071 | MATIERE TRAVAUX PUBLIC | AC 03 - 06-07-08-9 | 1 157 934,77 F | 110 009,50 F | 1 267 944,27 F |
| 25/10/99 | 09/99 | 15471 | 104474 | MATIERE TRAVAUX PUBLIC | AC 04 | 179 774,37 F | 17 076,51 F | 196 850,88 F |
| 25/10/99 | 09/99 | 15471 | 104475 | MATIERE TRAVAUX PUBLIC | AC 04 | 9 481,84 F | 899,67 F | 10 381,51 F |
| MARCHE N° 99002 L.01 | | | | | | 2 609 921,69 F | 247 942,56 F | 2 857 864,25 F |
| LB 6442 TRAVAUX VRD PRIMAIRE | | | | | | 2 609 921,69 F | 247 942,56 F | 2 857 864,25 F |

| Date Ar | Mois F | Iméro Chron | N° autc | Nom Fournisseurs | Libellé | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|--|--------|-------------|---------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| PRD 4 TRAVAUX VRD PRIMAIRES | | | | | | 2 609 921,69 F | 247 942,56 F | 2 857 864,25 F |
| 15/03/99 | 07/99 | 15106 | 104070 | CORALJUD MICHEL | AC 03 | 4 432,09 F | 421,05 F | 4 853,14 F |
| 04/03/99 | 07/99 | 14522 | 103849 | CORALJUD MICHEL | AC 02 | 28 395,10 F | 2 697,53 F | 31 092,63 F |
| 20/10/99 | 09/99 | 15319 | 104408 | CORALJUD MICHEL | AC 04 | 1 127,43 F | 107,10 F | 1 234,53 F |
| 31/12/99 | 12/99 | 16004 | 105143 | CORALJUD MICHEL | AC 05 | 35 377,59 F | 3 360,67 F | 38 738,26 F |
| 15/03/99 | 07/99 | 15106 | 104069 | SODEP | AC 03 | 37 215,53 F | 3 535,47 F | 40 751,00 F |
| 20/10/99 | 09/99 | 15319 | 104409 | SODEP | AC 04 | 9 264,47 F | 862,03 F | 10 126,50 F |
| MARCHE N° 98041 L.01 | | | | | | 115 832,21 F | 11 004,05 F | 126 836,26 F |
| LB 5500 MAITRISE D'OEUVRE | | | | | | 115 832,21 F | 11 004,05 F | 126 836,26 F |
| PRD 8 ETUDES, HONORAIRES, B.E.T. | | | | | | 115 832,21 F | 11 004,05 F | 126 836,26 F |
| 02/11/98 | 11/98 | FRAIS 11/98 | 100453 | DEBLES/JP | | 500,00 F | 0,00 F | 500,00 F |
| 07/12/99 | 12/98 | FRAIS 11/98 | 100767 | DEBLES/JP | | 309,00 F | 0,00 F | 309,00 F |
| 03/05/99 | 05/99 | 13336 | 101030 | LARDICHE JOUBERT JOEL | | 12 900,00 F | 1 228,00 F | 14 128,00 F |
| 19/06/99 | 05/99 | 13303 | 102100 | NID | | 16 790,00 F | 1 595,05 F | 18 385,05 F |
| 25/04/99 | 04/99 | 13561 | 101854 | PROJECT | | 73,65 F | 7,00 F | 80,65 F |
| 20/07/99 | 07/99 | 14377 | 103442 | PROJECT | FA 9914733 D. 30 | 505,36 F | 48,01 F | 553,37 F |
| 17/08/99 | 07/99 | 14711 | 103710 | PROJECT | FA 9915043 CDE | 250,32 F | 23,78 F | 274,10 F |
| 30/11/99 | 09/99 | 15209 | 104727 | PROJECT | FA 9915632 CDE | 150,00 F | 14,25 F | 164,25 F |
| 31/12/99 | 12/99 | 16052 | 105214 | PROJECT | FA 9916507 CDE | 1 623,26 F | 154,39 F | 1 777,64 F |
| MARCHE N° | | | | | | 33 106,59 F | 3 068,77 F | 36 175,36 F |
| LB 5520 FRAIS DIVERS REMUNERABLES | | | | | | 33 106,59 F | 3 068,77 F | 36 175,36 F |
| PRD 10 AUTRES DEPENSES REMUNERABLES | | | | | | 33 106,59 F | 3 068,77 F | 36 175,36 F |
| 31/12/99 | 12/99 | | 104170 | SODIAC | FRAIS-FIAU 31/12 | 4 648,76 F | 0,00 F | 4 648,76 F |
| MARCHE N° | | | | | | 4 648,76 F | 0,00 F | 4 648,76 F |
| LB 5561 FRAIS FINANCIERS CT | | | | | | 4 648,76 F | 0,00 F | 4 648,76 F |
| PRD 13 FRAIS FINANCIERS CT | | | | | | 4 648,76 F | 0,00 F | 4 648,76 F |
| 02/12/99 | 12/99 | 11116134 | 104316 | SODIAC | HG 03/116 134 | 97 362,13 F | 9 249,40 F | 106 611,53 F |
| 31/12/99 | 12/99 | 14116151 | 105204 | SODIAC | HG 04/116 151 | 3 511,65 F | 333,61 F | 3 845,26 F |
| MARCHE N° | | | | | | 100 873,78 F | 9 583,01 F | 110 456,79 F |
| LB 5620 HONORAIRES DE GESTION PROP/DEPENSE | | | | | | 100 873,78 F | 9 583,01 F | 110 456,79 F |
| PRD 21 HONORAIRES DE GESTION PROP / DEPENSE | | | | | | 100 873,78 F | 9 583,01 F | 110 456,79 F |
| 01/12/98 | 12/98 | 01116170 | 100849 | SODIAC | FA HG 01/116 170 | 75 000,00 F | 7 125,00 F | 82 125,00 F |
| 29/04/99 | 04/99 | 12116187 | 102543 | SODIAC | REM 02/116 87 | 75 000,00 F | 7 125,00 F | 82 125,00 F |
| MARCHE N° | | | | | | 150 000,00 F | 14 250,00 F | 164 250,00 F |
| LB 5622 HONORAIRES DE GESTION FORFAITAIRES | | | | | | 150 000,00 F | 14 250,00 F | 164 250,00 F |
| PRD 23 HONORAIRES DE GESTION FORFAITAIRES | | | | | | 150 000,00 F | 14 250,00 F | 164 250,00 F |
| TOTAL OPERATION | | | | | | 3 619 610,02 F | 343 064,59 F | 3 962 674,61 F |

OP 116 PARC URBAIN DE LA TRINITE SE
RECETTES CUMULEES REALISEES AU 31/12/99

Heure : 10:34

Date : 22/11/00

| au | Chror | Date | Date Régl | Nom Client | Libellés | Montant HT | Montant TVA | Montant TTC |
|----------------------------------|------------|----------|-----------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 33241 | 01-118-45 | 30-09-99 | 14-10-99 | COMMUNE DE SAINT DENIS | DR 01-118-45 | 61 435,20 F | 0,00 F | 61 435,20 F |
| 33241 | 02-118-50 | 29-10-99 | 14-10-99 | COMMUNE DE SAINT DENIS | DR 02-118-50 | 4 483,13 F | 0,00 F | 4 483,13 F |
| 33242 | 03-118-65 | 19-11-99 | 02-12-99 | COMMUNE DE SAINT DENIS | DR 03-118-65 | 100 956,69 F | 0,00 F | 100 956,69 F |
| 33247 | 01-118-70 | 01-12-99 | 07-12-99 | COMMUNE DE SAINT DENIS | HG 01-118-70 | 62 125,00 F | 0,00 F | 62 125,00 F |
| 33250 | 04-118-74 | 04-12-99 | 02-12-99 | COMMUNE DE SAINT DENIS | DR 04-118-74 | 65 259,02 F | 0,00 F | 65 259,02 F |
| 33267 | 05-118-91 | 19-02-99 | 02-12-99 | COMMUNE DE SAINT DENIS | DR 05-118-91 | 11 001,33 F | 0,00 F | 11 001,33 F |
| 33430 | 02-118-090 | 29-04-99 | 07-12-99 | COMMUNE DE SAINT DENIS | FA 02-118-090 | 62 125,00 F | 0,00 F | 62 125,00 F |
| 33515 | 06-118-093 | 27-06-99 | 07-12-99 | COMMUNE DE SAINT DENIS | DR 06-118-093 | 1 455 915,92 F | 0,00 F | 1 455 915,92 F |
| 33575 | 07-118-095 | 23-09-99 | 09-12-99 | COMMUNE DE SAINT DENIS | DR 07-118-095 | 1 182 247,57 F | 0,00 F | 1 182 247,57 F |
| 33581 | 08-118-121 | 01-12-99 | 23-12-00 | COMMUNE DE SAINT DENIS | DR 08-118-121 | 187 934,12 F | 0,00 F | 187 934,12 F |
| 33582 | 02-118-131 | 02-12-99 | 09-12-00 | COMMUNE DE SAINT DENIS | HG 02-118-131 | 106 611,53 F | 0,00 F | 106 611,53 F |
| 33583 | 04-118-151 | 31-12-99 | 20-02-00 | COMMUNE DE SAINT DENIS | HG 04-118-151 | 3 845,26 F | 0,00 F | 3 845,26 F |
| 33592 | 09-118-150 | 31/12/99 | 20-02-00 | COMMUNE DE SAINT DENIS | DR 09-118-150 | 115 505,58 F | 0,00 F | 115 505,58 F |
| LE 5901 DEMANDE DE REMBOURSEMENT | | | | | | 3 459 485,41 F | 0,00 F | 3 459 485,41 F |
| PRD 60 DEMANDE DE REMBOURSEMENT | | | | | | 3 459 485,41 F | 0,00 F | 3 459 485,41 F |
| 33549 | 01-118-29 | 03/08/99 | 28-11-99 | COMMUNE DE SAINT DENIS | FA 01-118-29 | 2 000 000,00 F | 0,00 F | 2 000 000,00 F |
| LE 5902 AVANCE MANDANT | | | | | | 2 000 000,00 F | 0,00 F | 2 000 000,00 F |
| PRD 74 AVANCE MANDANT | | | | | | 2 000 000,00 F | 0,00 F | 2 000 000,00 F |
| TOTAL OPERATION | | | | | | 5 459 485,41 F | 0,00 F | 5 459 485,41 F |
